



ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

Ordem de Serviço nº 29185	Data: 20/05/2024 00:00
Cliente: AENA - AEROPORTO CONGONHAS	Razão Social: BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL SA
CNPJ:	
Endereços: Avenida Washington Luís, s/nº / Aeroporto - Vila Congonhas - 04626-911 / São Paulo, SP	
Responsável: Time Congonhas	
Checkin : 20/05/2024 08:20	Checkout : 20/05/2024 08:46
Contato:	
Descrição: Manutenção Corretiva	
Número de ativo: TPS-PV1-CIN	
Local: Aeroporto Congonhas/inspeção Echo	
Equipamento: módulo Echo raio-x 0005 Astrophysics	
Série: ASTVA180SDVS521	
Técnico: Marcio	
Comentários:	
Fotos:	



Foto da Galeria

Foto 1



Foto da Galeria

Foto 2



Foto da Galeria

Foto 3

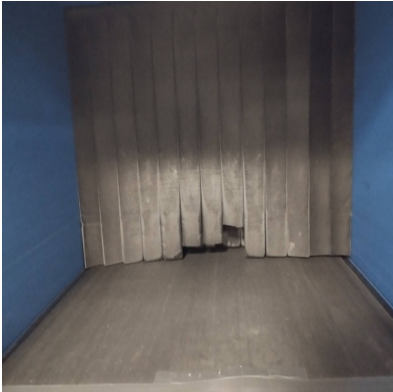


Foto da Galeria

Foto 4

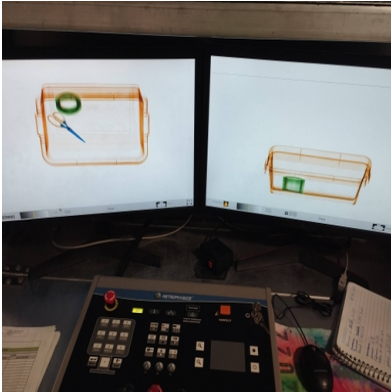


Foto da Galeria

Foto 5

Comentários das Fotos:

- 1. Abertura da esteira
- 2. Cortina desgastada
- 3. Aplicação de fita tape
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição

Formulários 1.0:
EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:
MODELO: XIS6545DVS
NUMERO DE SERIE: ASTVA180SDVS521
MARCA: ASTROPHYSICS

1 - INSPEÇÃO INICIAL
ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Não
MOTIVO DA VISITA: - Corretiva
LOCAL DE INSTALAÇÃO: - Bom
INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim
ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim

V - VOLTAGEM DE REDE AC: 220
V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Sim
VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK: 220
TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Sim
RELATÓRIO DE ERROS: - Não
TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Sim
EQUIPAMENTO - Baixa
VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Não

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: - Não
VERIFICAÇÃO MECÂNICA: - Sim
CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim
ROLETES E MOTOR: - Sim
BARREIRA DE LUZ: - Sim
MONITOR: - Sim
CORTINAS: - Não
TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Não

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Não
FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Não
CORREIA TRANSPORTADORA: - Não
CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Não
CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Não
LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Não
LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Não
TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Não
ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Sim
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO: - Não

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:
RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:
UA - CORRENTE ANODO:
KV - ALTA VOLTAGEM POS:
KV - ALTA VOLTAGEM NEG:

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:
V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:
V - CORRENTE ANODO:
V - ALTA VOLTAGEM:
VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Não
TESTE FUNCIONAL FINAL: - Sim
CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Não

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Operante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: Relato do solicitante: Imagem metálica escura, ao trocar de login , uma tela parou de funcionar.

OBS: Verificado que a esteira está descolando no meio da divisa e cortina de entrada desgastada, ocorrendo a abertura na parte inferior

Manutenção realizada: Reiniciado o Windows nas duas telas. Após procedimento, feito testes e liberado para uso. Aplicação de fita tape na abertura da esteira.

OBS2: Necessário passar orçamento de esteira e cortina plumbifera.

Documento: 27.994.737-9 - **Assinatura de:** MARCIO EDUARDO DE MEDEIROS

